

汕尾市“十件民生实事” 农村路桥升级改造项目

2022年，海丰县、陆丰市双双被列为“四好农村路”全国示范县创建单位名单。市交通运输局按照2022年汕尾市十件民生实事分工安排，牵头开展农村路桥升级改造行动的工作，组织实施部分建制村单车道改双车道及危桥改造项目，改善人民群众的出行条件，全市完成通建制村单车道改双车道项目30公里，完成危桥改造14座。具体任务如下：


01. 陆丰市完成农村公路建设12.31公里，危桥改造3座；

02. 海丰县完成农村公路建设5.37公里；

03. 陆河县完成农村公路建设10.79公里，危桥改造11座；

04. 红海湾完成农村公路建设1.69公里。

市“十件民生实事”项目位置示意图

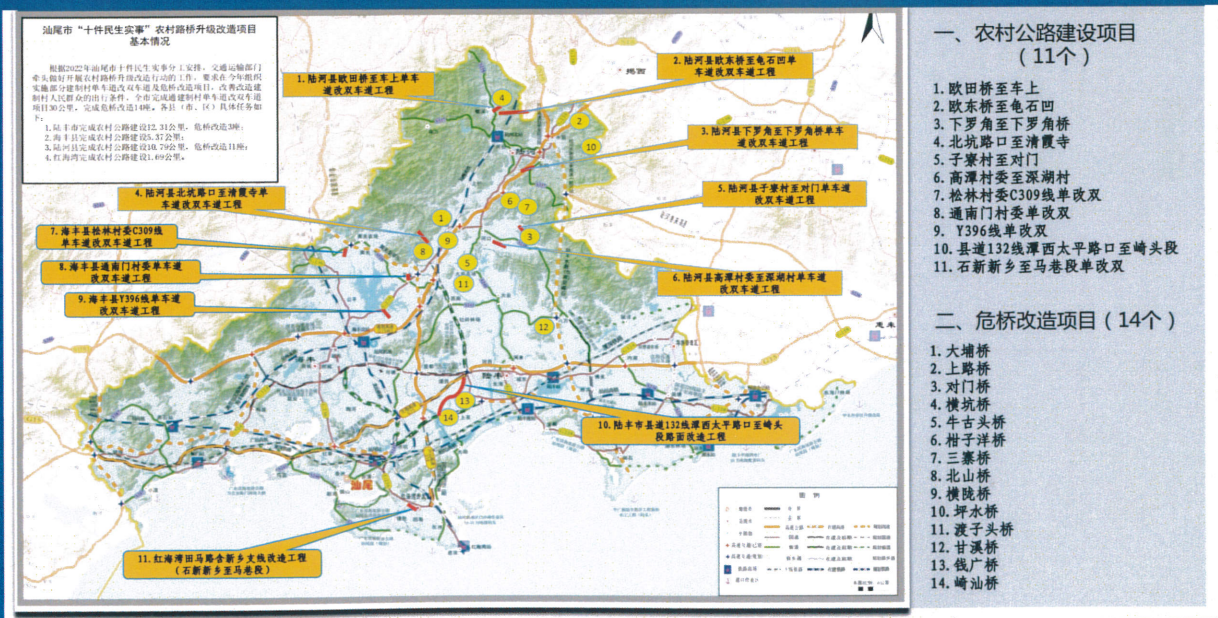

陆河

01. 陆河县螺溪镇欧田村委C253线

起于欧田桥止于车上，全长0.3公里，按四级公路双车道公路标准建设，采取扩宽路基路面，完善交通防护设施及培设路基防护等处治措施。改造后路基7米、路面从原来的4.5米扩宽到6米，项目总投资26.93万元，已于2022年10月完工。



02. 陆河县螺溪镇Y856欧东村委线

起于欧东桥止于龟石凹，路线全长4.077公里，按四级公路双车道公路标准建设，采取扩宽路基路面，拆除改建老旧桥梁、涵洞，对破损路段进行挖补修复，完善交通防护设施及培设路基防护等处治措施。改造后路基7米、路面从原来的4.5米扩宽到6米，项目总投资745.95万元，已于2022年10月完工。



03. 陆河县东坑镇C622下罗角至下罗角桥改建工程

起于东坑镇下罗角，止于下罗角桥，项目全长0.788公里，水泥混凝土由原路面宽2.2米加宽到6米原路基加宽到7米，土路肩2×0.5米，项目总投资79.7万元，已于2022年10月完工。



04. 陆河县新田镇C141线，从北坑路口至清霞寺段工程

全长2.017公里，按四级双车道公路标准建设，采取拓宽路基路面，完善交通防护设施等处治措施。改造后路基7米、路面拓宽至6米，项目总投资140万元，已于2022年10月完工。



05. 陆河县河口镇YA70子寮至对门改建工程

起于西湖村委子寮村，止于对门村，全长2.349公里，按四级公路标准建设，道路老路路面宽3.5米，本次拼宽3.5米，水泥混凝土路面宽由3.5米拼宽为7米，土路肩2×0.5米，拼宽后路基宽度为8米。项目总投资224万元，已于2022年10月完工。



06. 陆河县河口镇C611线高潭村委至深湖村委改建工程

起于高潭村委会止于深湖村，全长1.505公里，按四级公路标准建设，道路老路路面宽3.5米，本次拼宽3米，水泥混凝土路面宽由3.5米拼宽为6.5米，土路肩2×0.5米，拼宽后路基宽度为7.5米。项目总投资134万元，已于2022年7月完工。



海丰

01.海丰县黄羌镇松林村委C309线

起于红珠溜村止于汉塘仔村，全长1.184公里，按四级双车道公路标准建设，采取拓宽路基路面，加铺平面交叉转角，拆除改建老旧涵洞，完善交通防护设施及路基防护等处治措施。改造后路基7米、路面宽从原来的3.5米拓宽至6米，项目总投资120万元，已于2022年10月完工。



02.海丰县平东镇通南门村委YA31线

起于南门村村口止于上新村，全长2.945公里，按四级双车道公路标准建设，采取拓宽路基路面，加宽涵洞，完善交通防护设施及增设路基防护等处治措施。改造后路基7米、路面宽从原来的4.5米拓宽至6米，项目总投资240万元，已于2022年10月完工。



03.海丰县平东镇Y396线

起于虎狮岭路口止于塘坐下村，全长1.241公里，按四级双车道公路标准建设，采取拓宽路基路面、对破损路段进行挖补修复，增设交通防护设施等处治措施。改造后路基7米、路面宽从原来的4.5米拓宽至6米，项目总投资125万元，已于2022年10月完工。



陆丰

陆丰市县道132线潭西太平路口至崎头段路面改造工程

起于太平与国道G228相交处，经榆林学校、潭东村、潭西村、赤坎头、潭西二中、崎头，终点止于沙溪桥与X129相交，路线全长12.311公里，路面宽7.5米，采用三级公路进行建设，加铺沥青混凝土；拆除2650米原旧人行道、绿化带、水泥地面后重建人行道，增加LED路灯和行道树；项目总投资4249.7960万元，已于2022年3月完工。



红海湾

Y004线 2.288—3.973段田马路含新乡支线改造工程(石新新乡至马巷段)

起于红海湾大道(国道G236)石新村路口，终点于田墩街道石新新乡与田马路交口处，全长1.685公里，按四级双车道公路标准建设，采取“单车道改双车道改造+铺装沥青混凝土路面”方式改造建设。改造后路基8米、路面宽从原来的3.5米拓宽至6.5米，项目总投资613万元，已于2022年11月完工。





陆河

01.陆河县新田镇大埔桥改建工程

该桥桥梁全长 10.8 m，桥宽 7.5 m，上部构造：采用 1×10 m 钢筋混凝土实心板，桥面铺装为 C40 防水水泥砼；下部构造：桥台采用片石混凝土台身，扩大基础，已于2022年5月完工。



02.陆河县水唇镇上路桥改建工程

该桥桥梁全长18.04 m，桥宽6.5 m，桥梁上部结构采用1-13.0m钢筋混凝土现浇空心板，行车道宽5.5m，两侧各设0.5m宽防护栏，已于2022年10月完工。



03.陆河县河口镇Y822线对门桥改建工程

该桥梁全长11.44m，桥宽8.0m，上部结构采用为1×10m钢筋混凝土现浇空心板，下部结构采用重力式桥台，扩大基础，已于2022年1月完工。



04.陆河县螺溪镇横坑桥改建工程

该桥桥梁全长21.36m，桥宽9.0m，上部构造：采用现浇2-10.0m钢筋混凝土现浇空心板，桥面铺装为C40防水水泥砼；下部构造：下部结构采用重力式桥台，柱式墩，基础均采用扩大基础，已于2022年10月完工。



05.陆河县新田镇牛古头桥（加固）改建工程

该桥桥梁全长 116m，桥宽 8.1m，桥面净宽7.5m，上部结构采用7 - 16m后张法预应力混凝土筒支 T 型梁，下部结构采用重力式桥台、双柱式桥墩，桩基础，已于2022年11月26日完工。



06.陆河县上护镇柑子洋桥改建工程

该桥桥梁全长15m，桥宽 7.5 m，上部构造：采用 1-13.0m 钢筋混凝土现浇空心板，桥面铺装为 C40 防水水泥砼；下部构造：下部结构采用薄壁桥台，扩大基础，已于2022年10月完工。





陆河

07.陆河县上护镇C616线三寨桥改建工程

该桥桥梁全长12.67m，桥宽6.5m，上部构造：采用现浇1-10.0 m钢筋混凝土空心板，桥面铺装为C40防水水泥砼；下部构造：下部结构采用重力式桥台，扩大基础，已于2022年10月完工。



08.陆河县新田镇Y843线北山桥改建工程

该桥桥梁全长28.49m，桥宽10m，上部采用为3×8 m 钢筋混凝土实心板，两侧各设1.5m宽防护栏，已于2022年11月完工。



09.陆河县新田镇横陇桥改建工程

该桥桥梁全长12m，桥宽7.5m，上部构造：采用现浇1-8.0 m钢筋混凝土实心板，桥面铺装为C40防水水泥砼；下部构造：采用桩接盖梁桥台，钻孔灌注桩基础，已于2022年11月完工。

10.陆河县水唇镇坪水桥改建工程

该桥桥梁全长 18.04m，桥宽7.5m，桥面净宽6.5m，上部结构采用1×13m钢筋混凝土空心板，下部结构采用薄壁桥台，扩大基础，已于2022年11月24日完工。



11.陆河县新田镇渡子头桥（加固）改建工程

该桥桥梁全长 90m，桥宽全宽 6.9m，桥面净宽 5.9m，本项目是加固工程，对上部结构及下部结构进行加固及修复，已于2022年11月24日完工。





陆丰

01.陆丰市河东镇Y609线甘溪桥危桥改建工程

该桥位于陆丰市河东镇村道Y609线上，旧桥梁长26米，宽5米，经改造后桥梁全长36米，桥宽8米；项目总投资470万元，已于2022年5月完工。



02.陆丰市C352线钱广桥改造工程

该桥位于陆丰市上英镇钱广村C352线上，旧桥桥梁全长11米，宽4米，经改造后桥长14米，宽8.5米；项目总投资95万元，已于2022年3月完工。

03.陆丰市潭溪镇崎汕桥改造工程

该桥位于县道X132崎头村内，对原桥长24米，宽8米进行了拆除，恢复路面为双向两车道，路面宽度8m，厚30cm混凝土面层，项目总投资49.42万元，已于2022年2月完工。

